

---

## 第 5 回

### 下田市立学校統合準備委員会 資料

- ・ 新中学校整備（工事関連）スケジュール
  - ・ 校舎大規模改修工事ステップ
-




第1工区

2020.7月~2020.10月(4ヶ月)


- 2020.7月~2021.3月(9ヶ月) 増築棟建設
- 2020.7月~10月(4ヶ月) 北棟東
- 2020.8月夏休み(1ヶ月) 配膳・廊下

クラス数

2020	2/2/3	7クラス
2021	2/2/2	6クラス

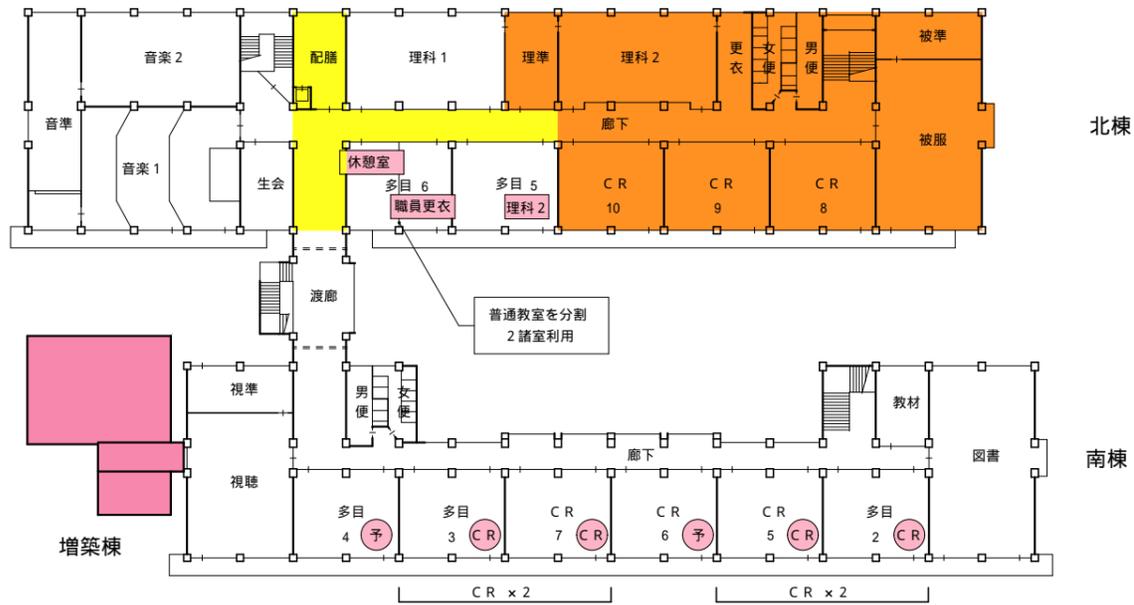

- ・用務員室 なし
- ・家庭科室 調理台なし
- ・理科室2 実験台なし
- ・生徒便所 職員兼用

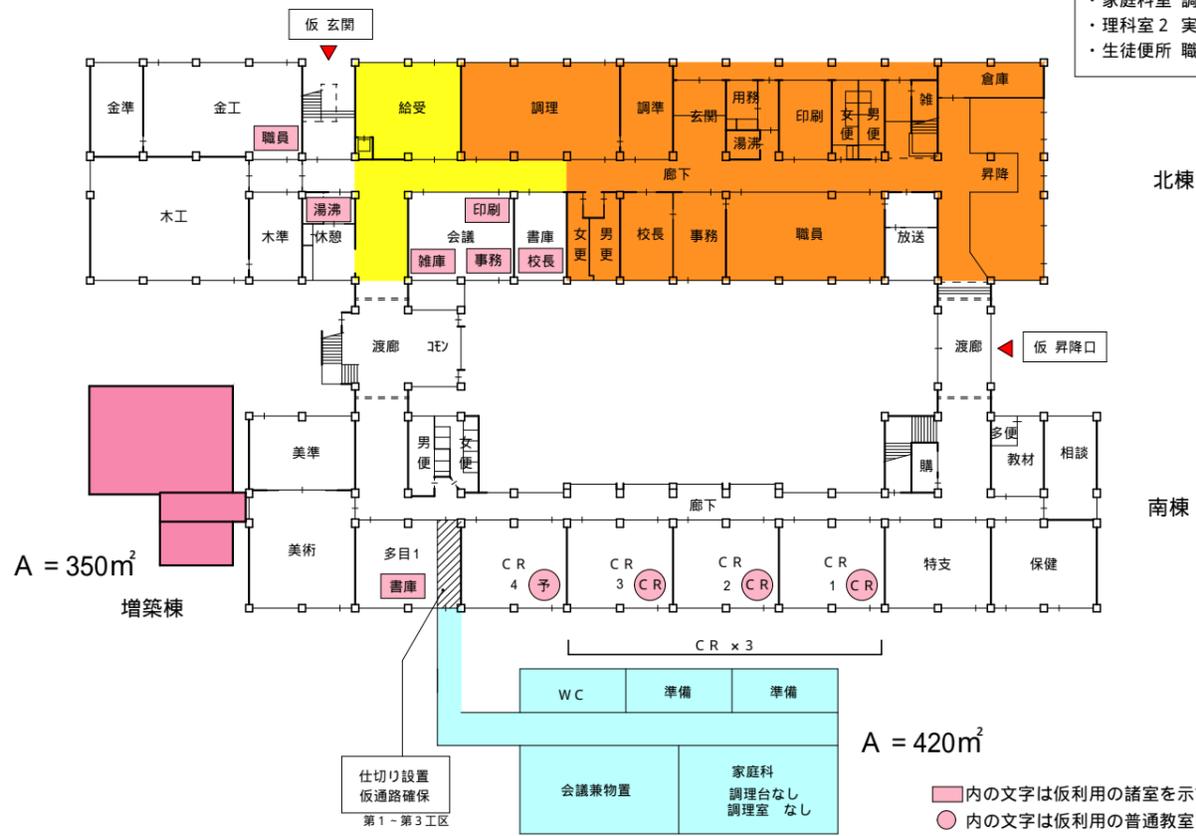


仕切り設置 仮通路確保 第1~第3工区  
 仮設校舎 前年度建設済  
 内の文字は仮利用の諸室を示す  
 内の文字は仮利用の普通教室を示す


第2工区

2020.11月~2021.3月(5ヶ月)

- 2020.11月(0.5ヶ月) 引越
- 2020.11月~2021.3月(4ヶ月) 北棟西
- 2021.3月(0.5ヶ月) 引越

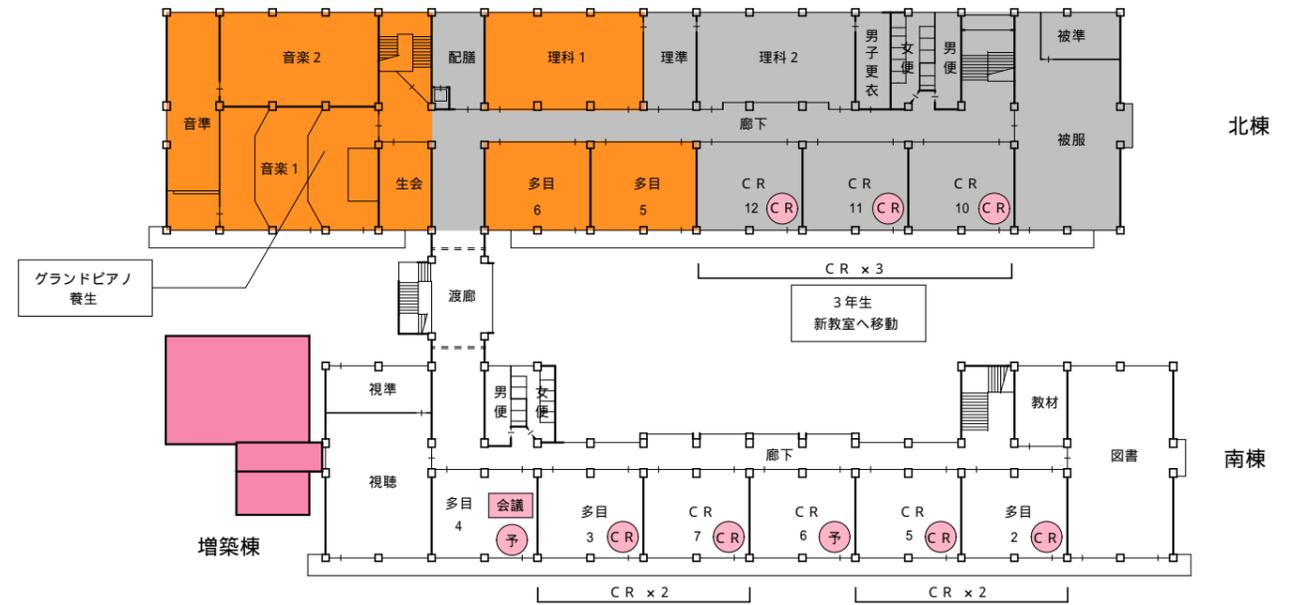

- ・予備室 2室のみ
- ・音楽室1,2 兼用

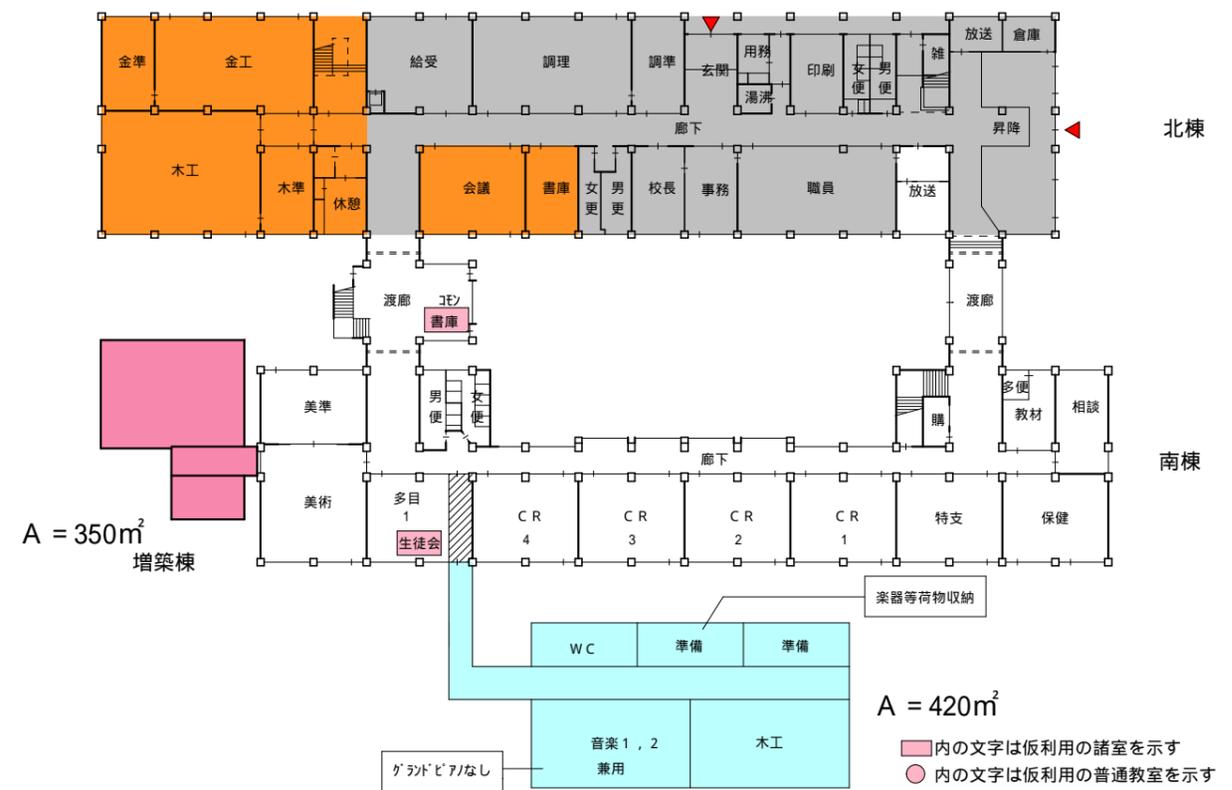


楽器等荷物収納  
 グランドピアノなし  
 内の文字は仮利用の諸室を示す  
 内の文字は仮利用の普通教室を示す

第3工区


2021.4月~2021.8月(5ヶ月)

- 2021.4月~8月(5ヶ月) 南棟東
- 2021.8月(1ヶ月)夏休み 渡り通路・廊下

クラス数			
2020	2/2/3	7クラス	
2021	2/2/2	6クラス	

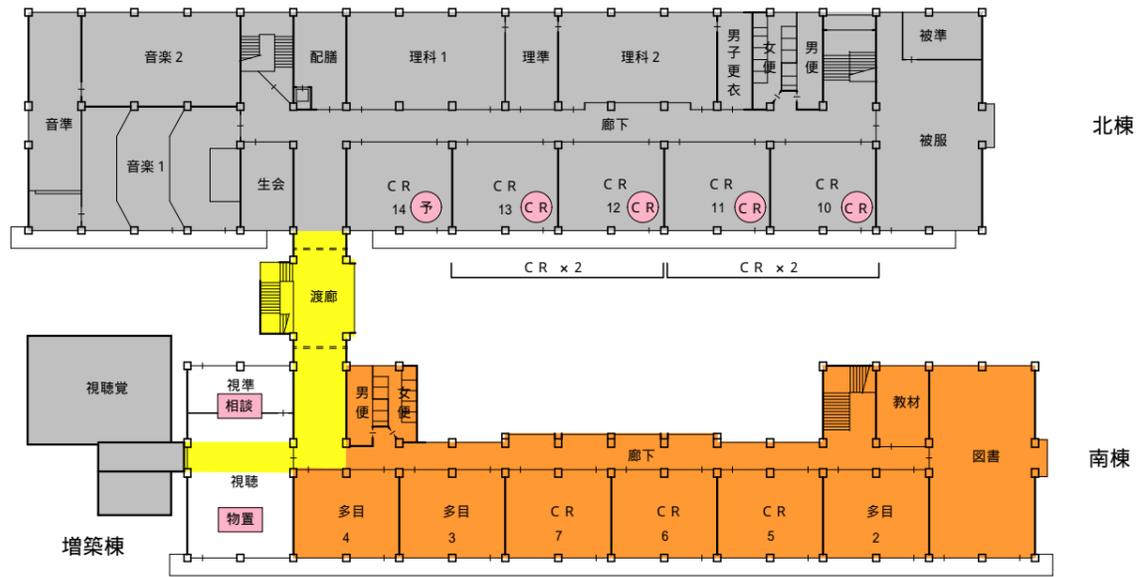

- ・予備室 2室のみ
- ・会議室, 予備室兼用
- ・保健室狭い

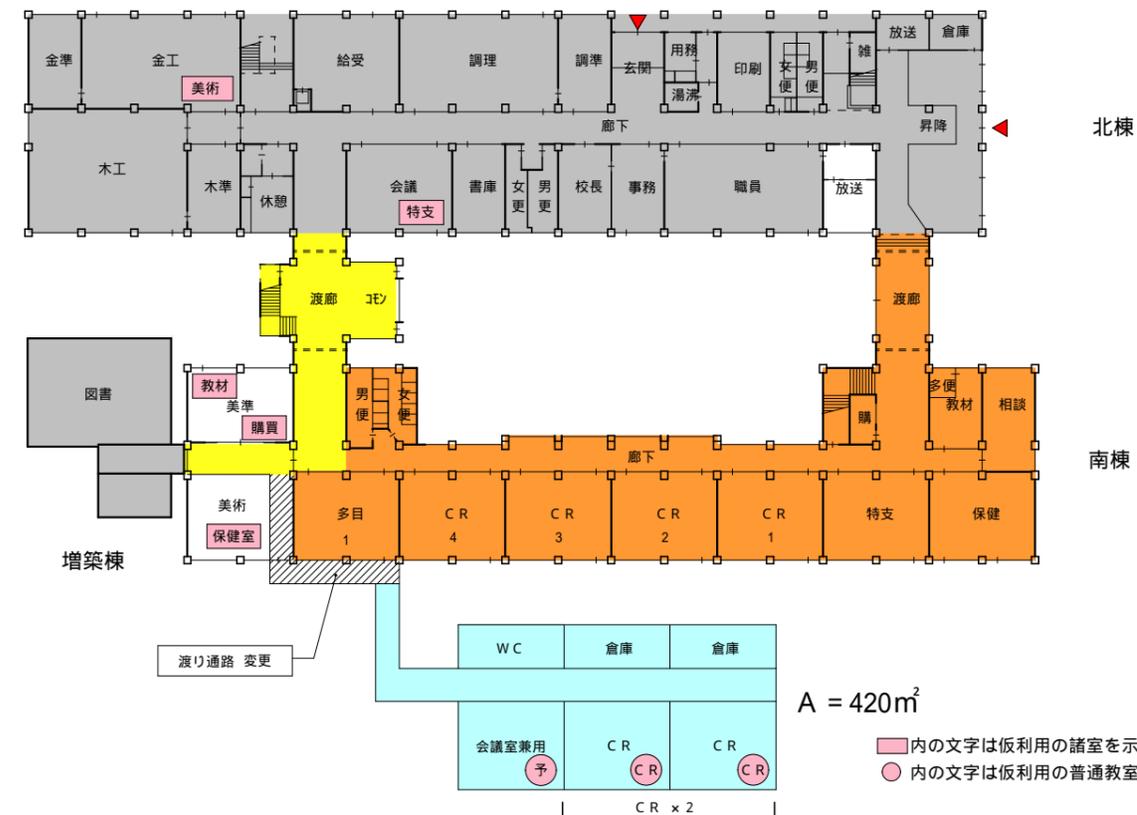


A = 420m<sup>2</sup>

- 内の文字は仮利用の諸室を示す
- 内の文字は仮利用の普通教室を示す

第4工区

2021.9月~2022.1月(5ヶ月)

- 2021.9月(1ヶ月)引越
- 2021.10月~2022.1月(4ヶ月) 南棟西改修  
仮設校舎解体

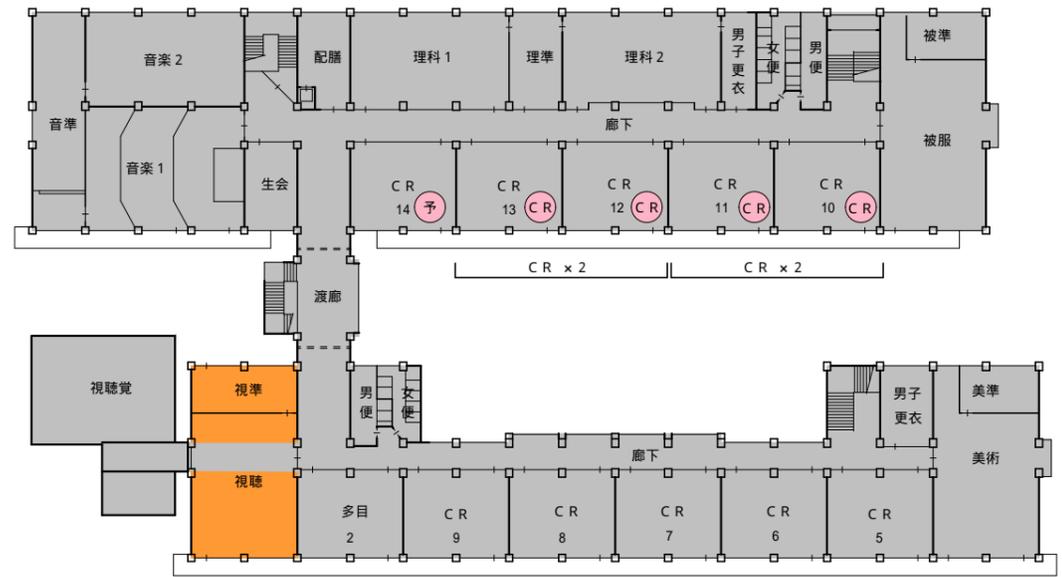

- 内の文字は仮利用の諸室を示す
- 内の文字は仮利用の普通教室を示す
