


## 第 8 回


# 下田市立学校統合準備委員会 資料

- ・ 新中学校整備計画について
-

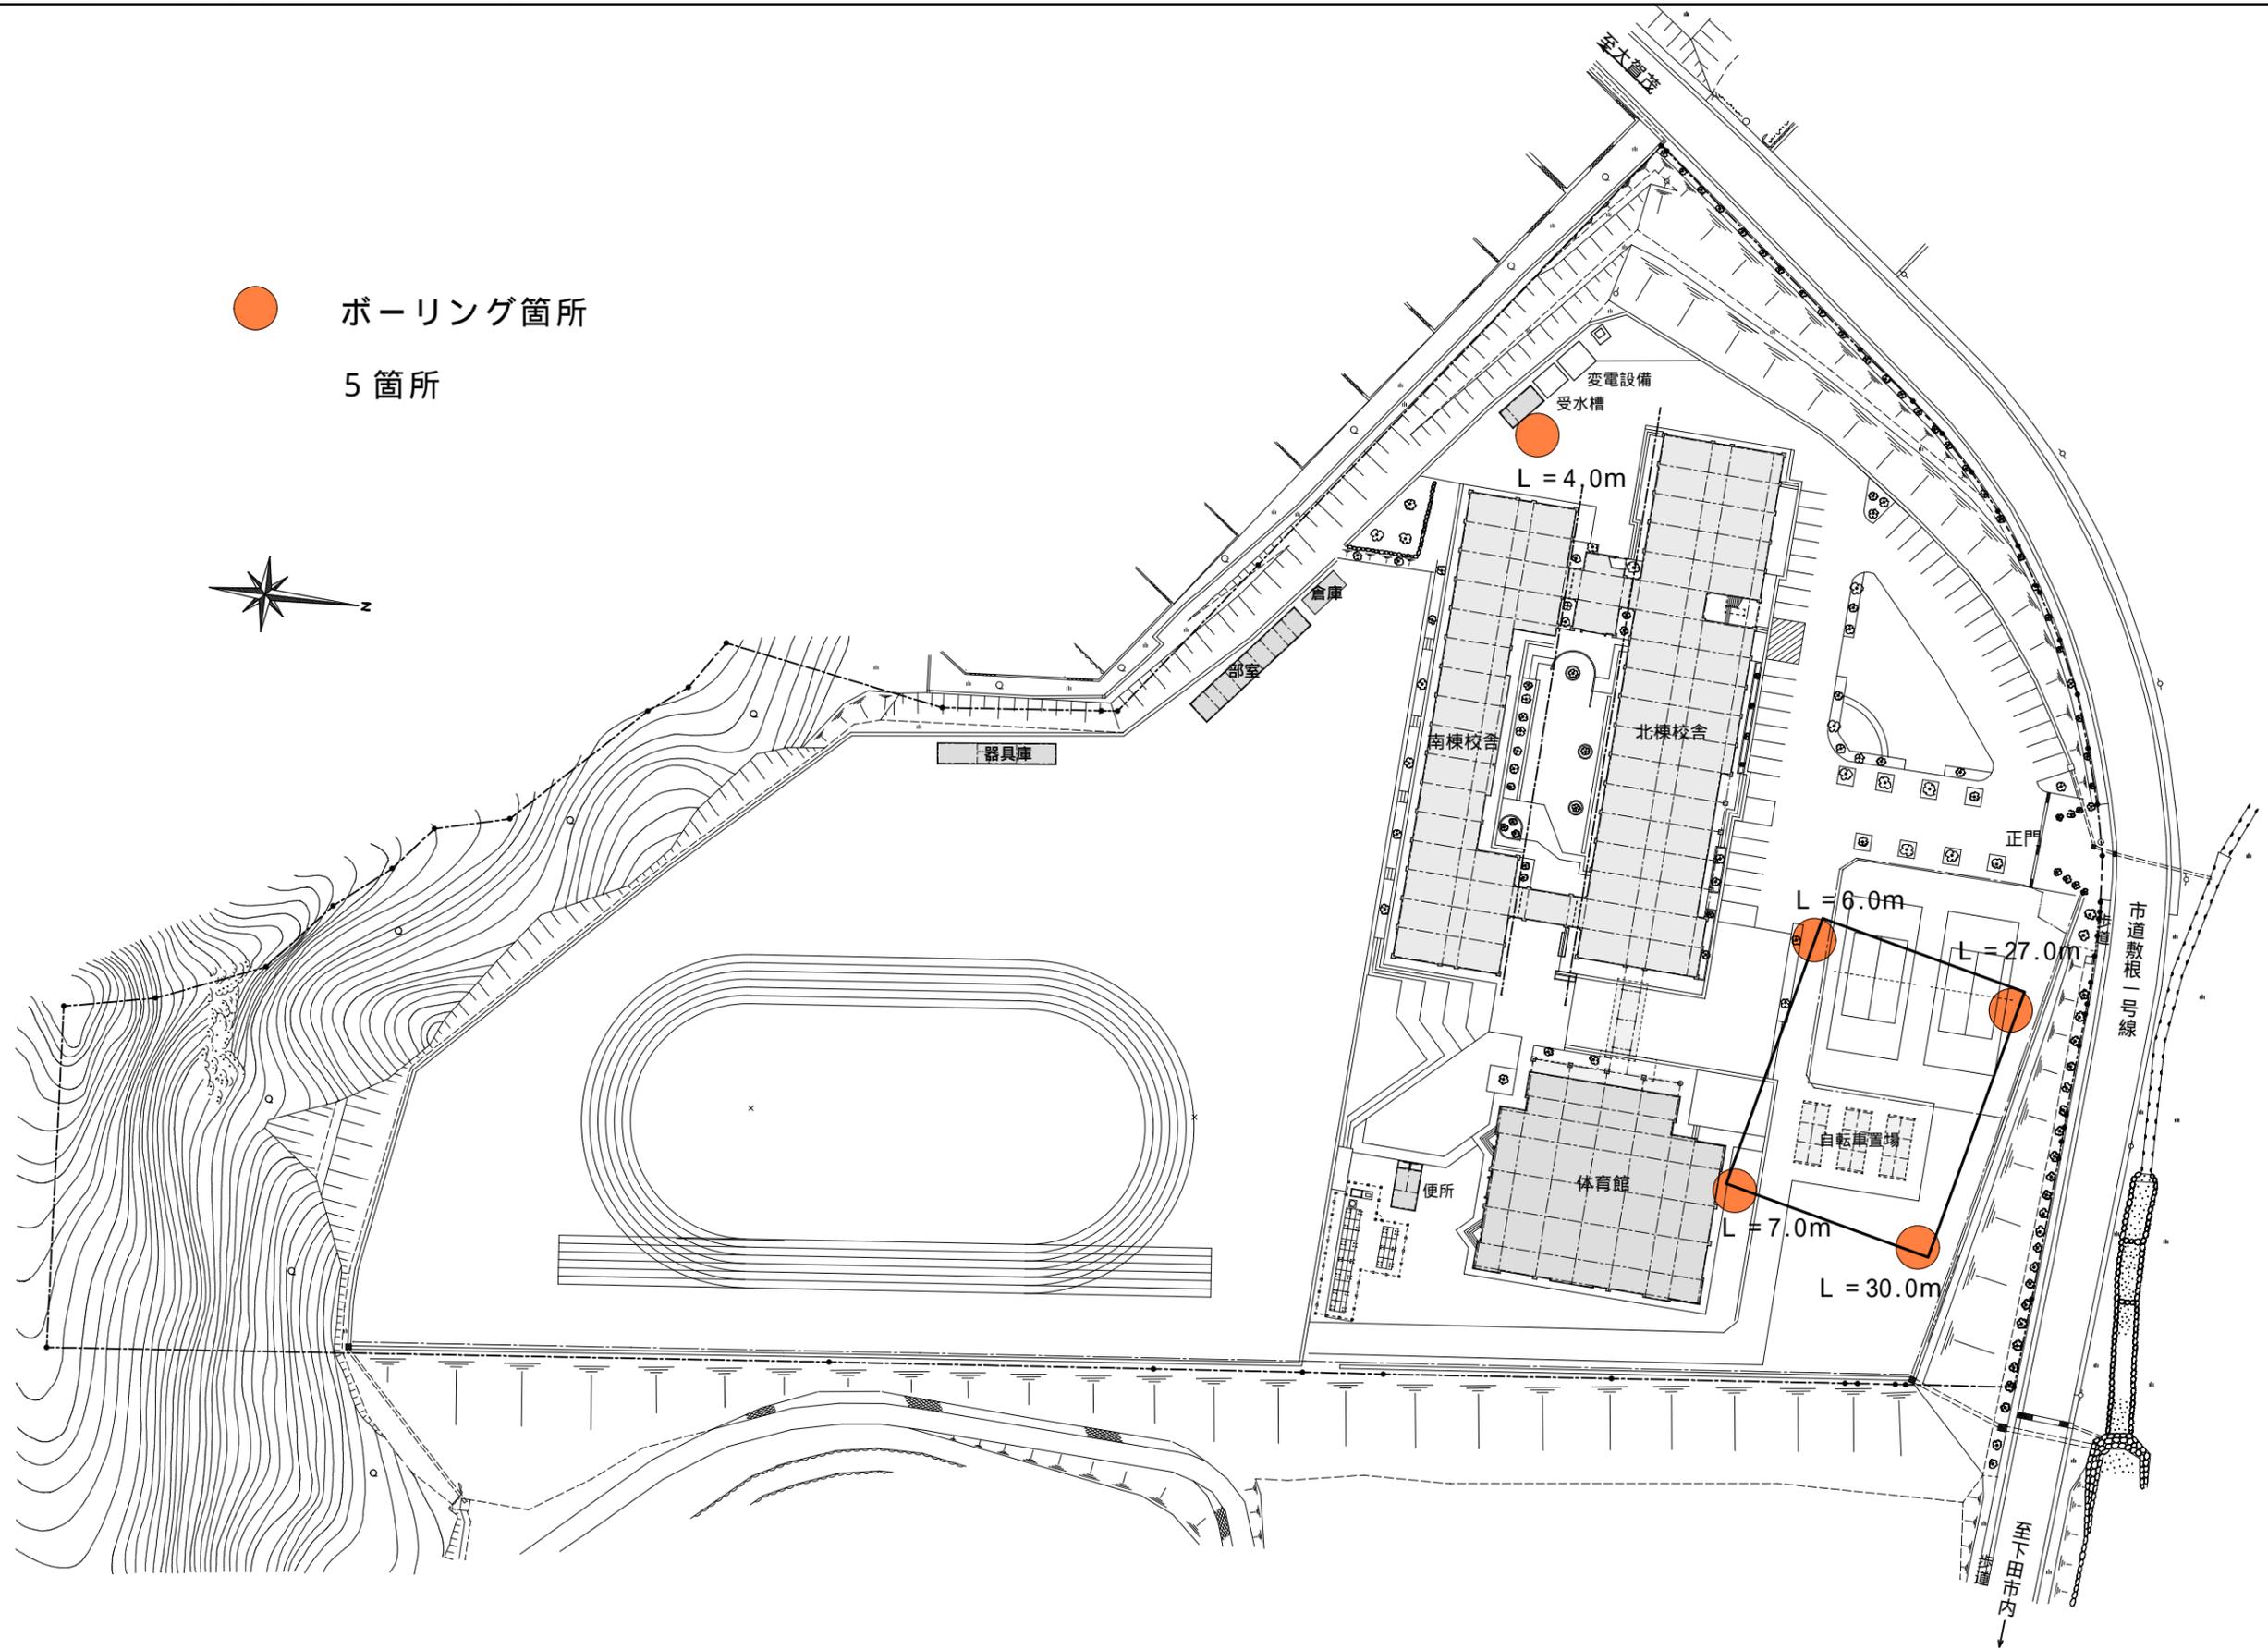



● ボーリング箇所  
5箇所

支持地盤までの掘削深  
●: ボーリング位置

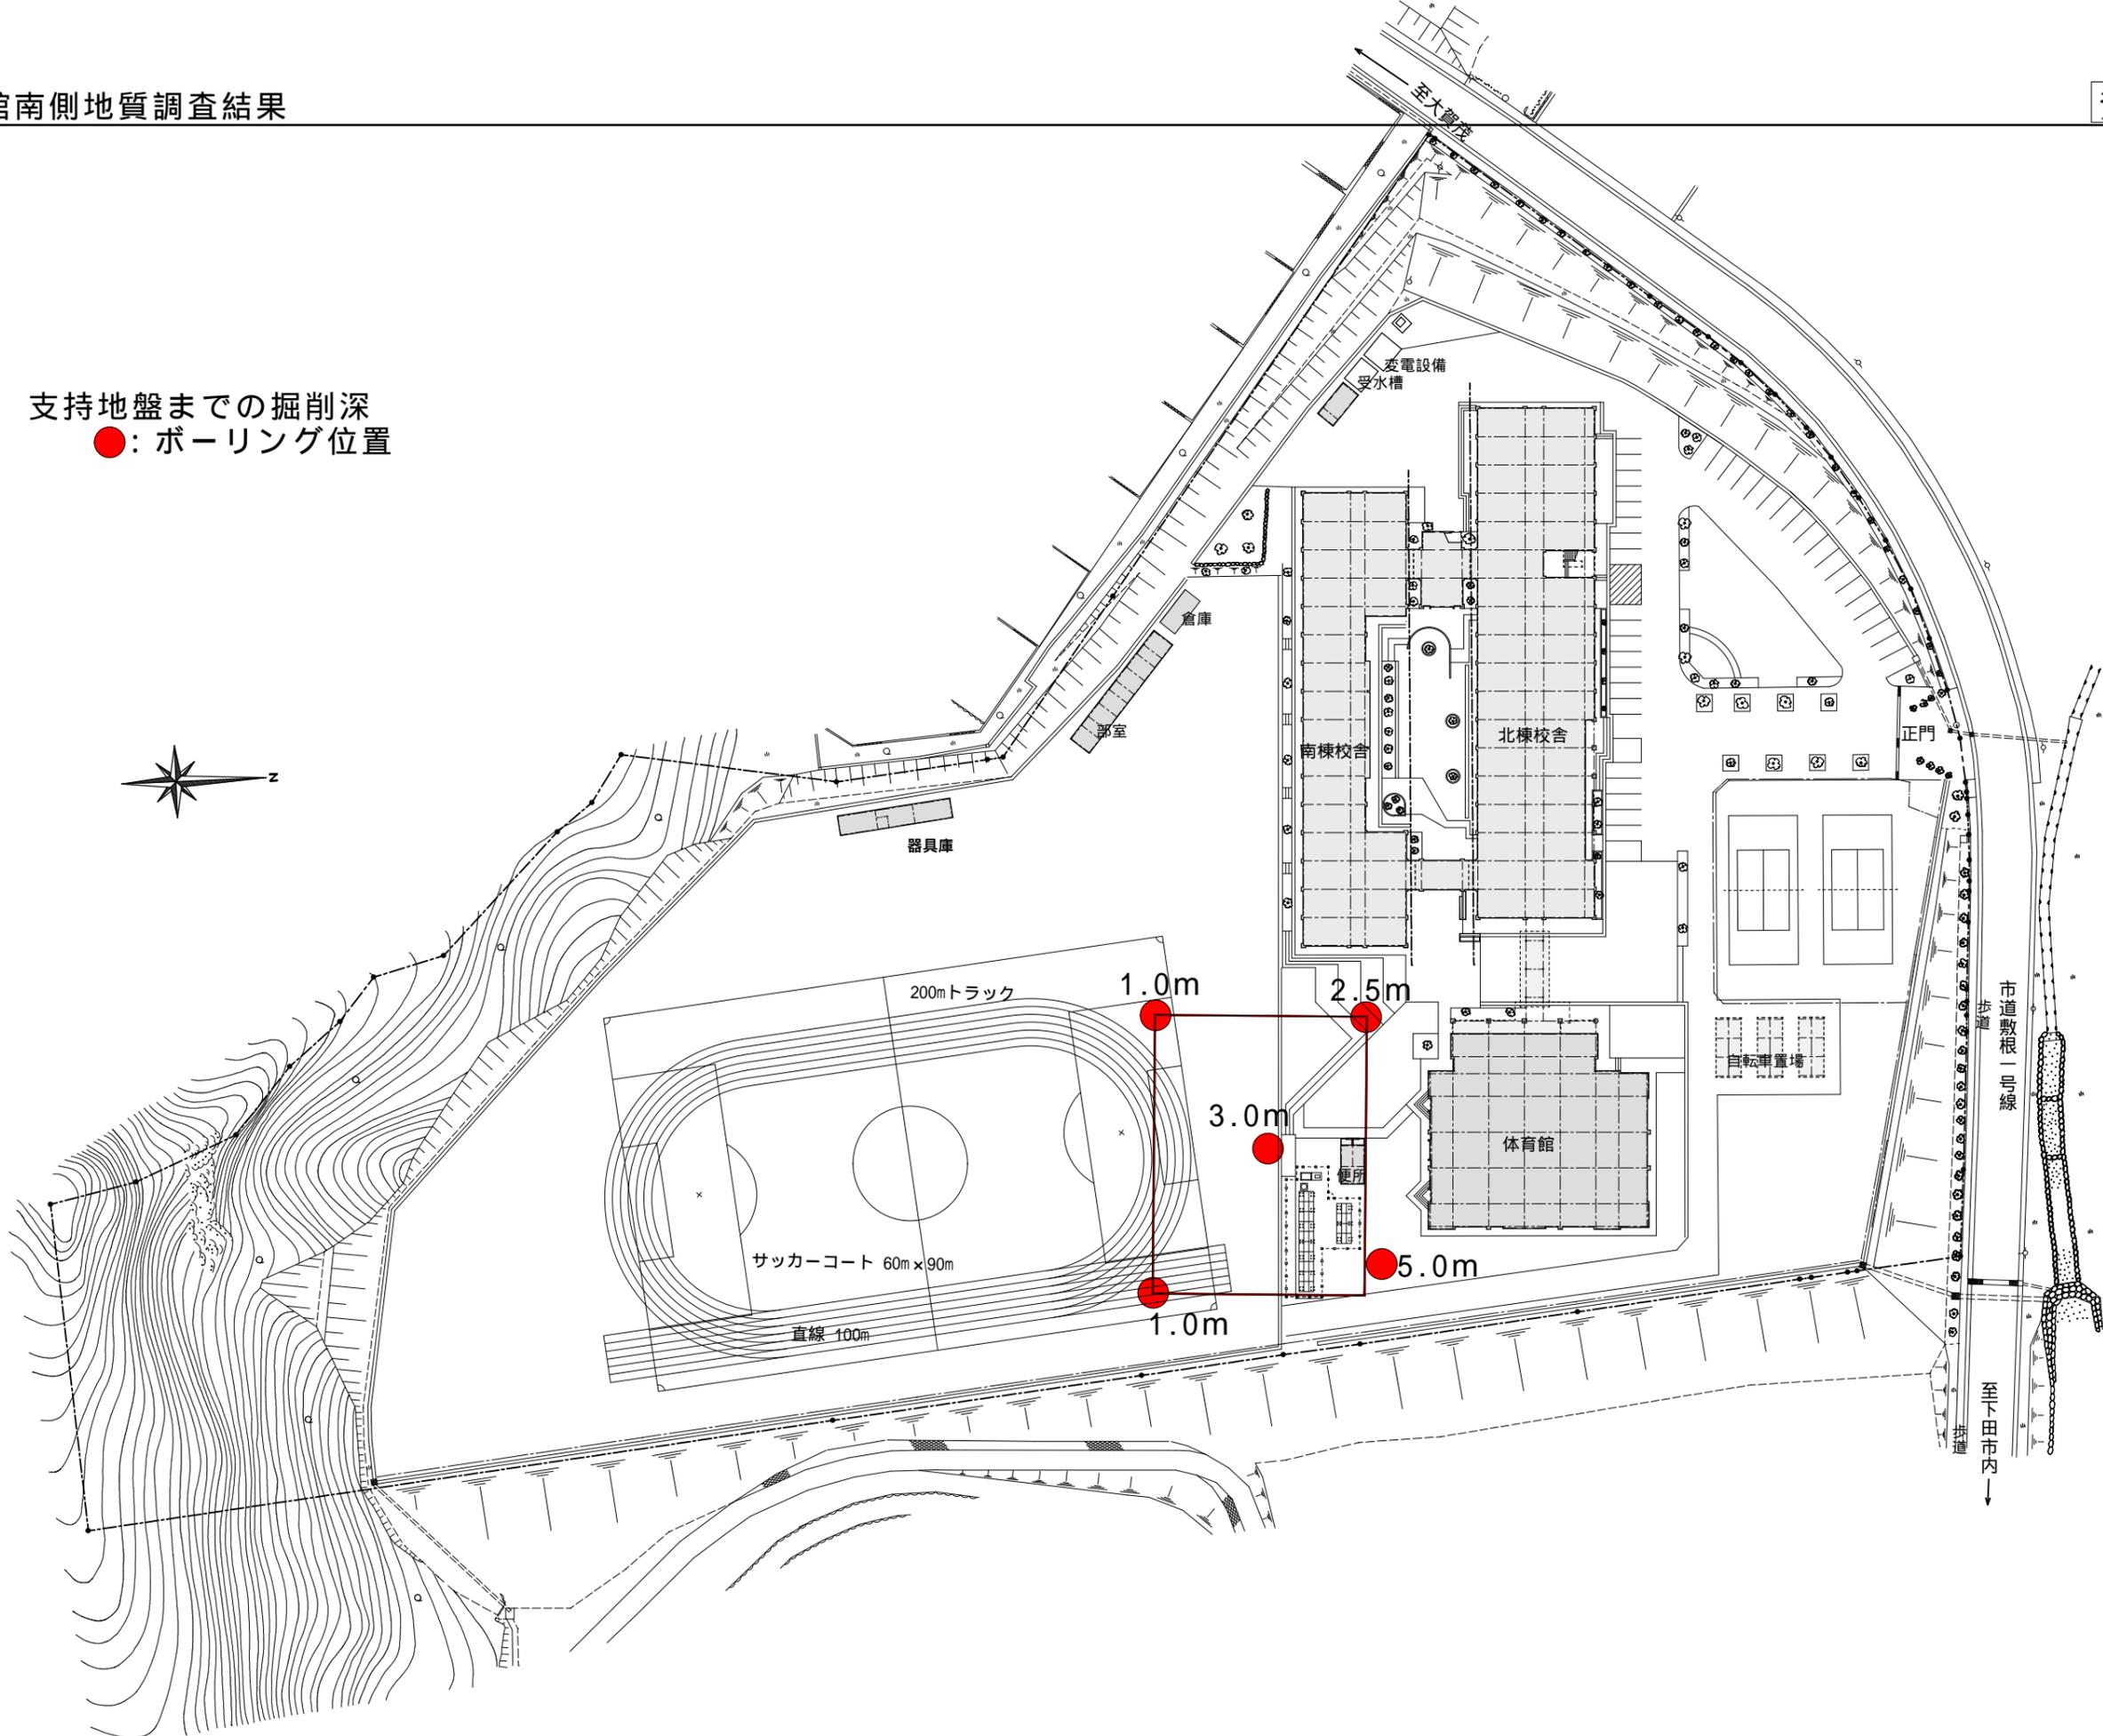

# 新配置図

- ・基本設計プランから新設体育館、テニスコート、駐輪場の配置を変更しました。
- ・歩道と車道が重ならないように歩車分離を明確にしたプランとなっています。
- ・渡り廊下は改修して利用し、校舎棟と新設体育館は武道場を介して行き来します。

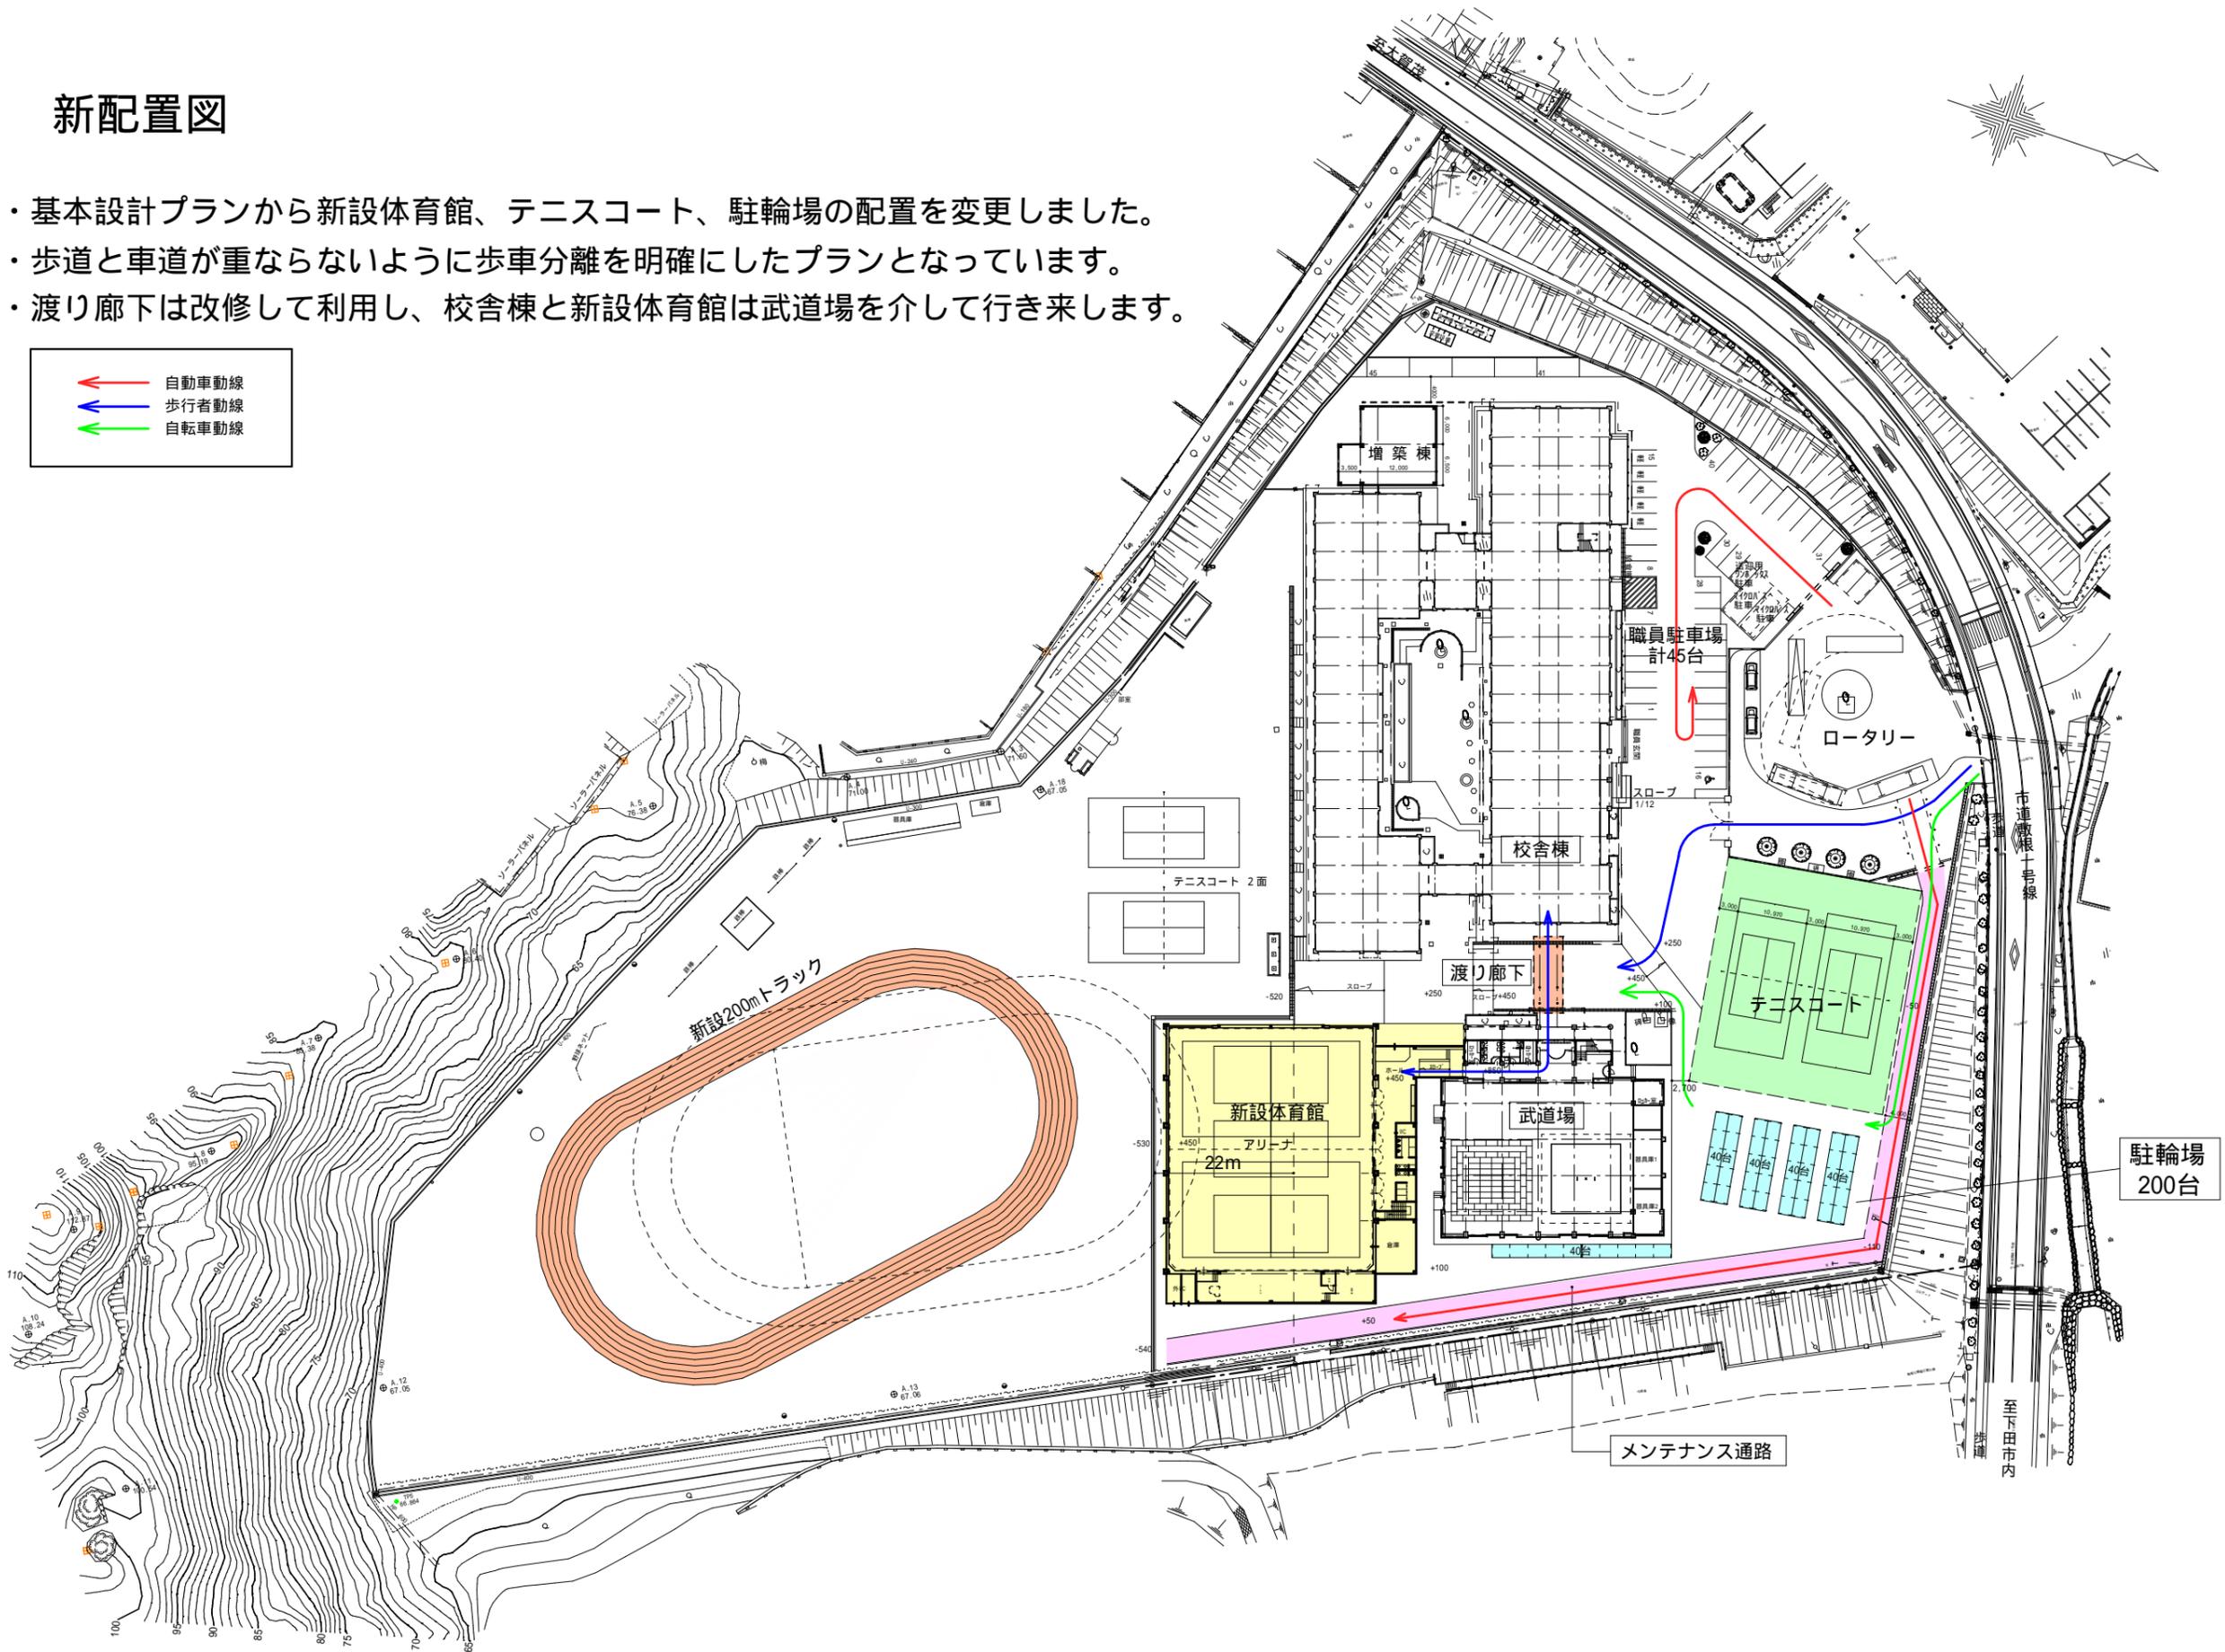




第1工区

2020.7月~2020.10月(4ヶ月)


- 2020.7月~2021.3月(9ヶ月) 増築棟建設
- 2020.7月~10月(4ヶ月) 北棟東
- 2020.8月夏休み(1ヶ月) 配膳・廊下

クラス数

2020	2/2/3	7クラス
2021	2/2/2	6クラス

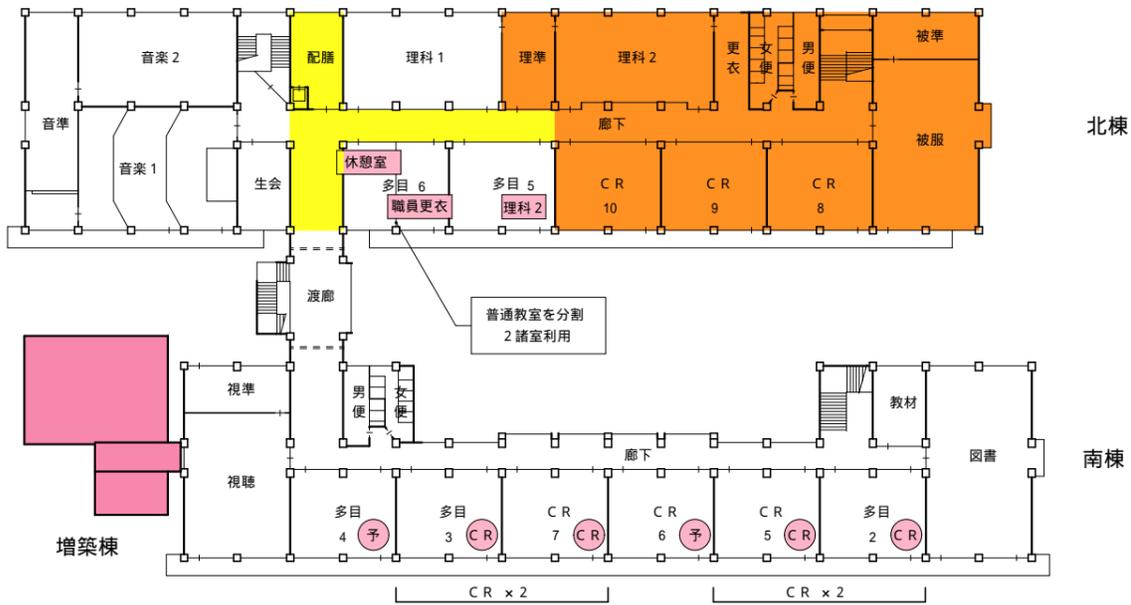


- ・用務員室 なし
- ・家庭科室 調理台なし
- ・理科室2 実験台なし
- ・生徒便所 職員兼用




第2工区

2020.11月~2021.3月(5ヶ月)

- 2020.11月(0.5ヶ月) 引越
- 2020.11月~2021.3月(4ヶ月) 北棟西
- 2021.3月(0.5ヶ月) 引越

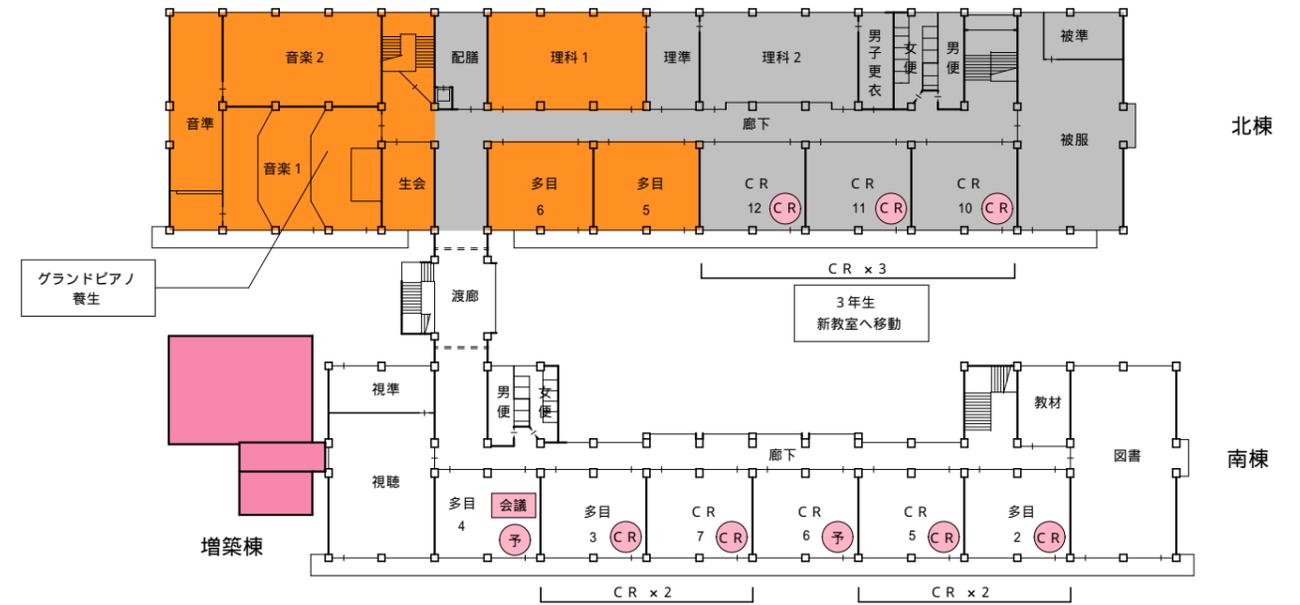


- ・予備室 2室のみ
- ・音楽室1, 2兼用

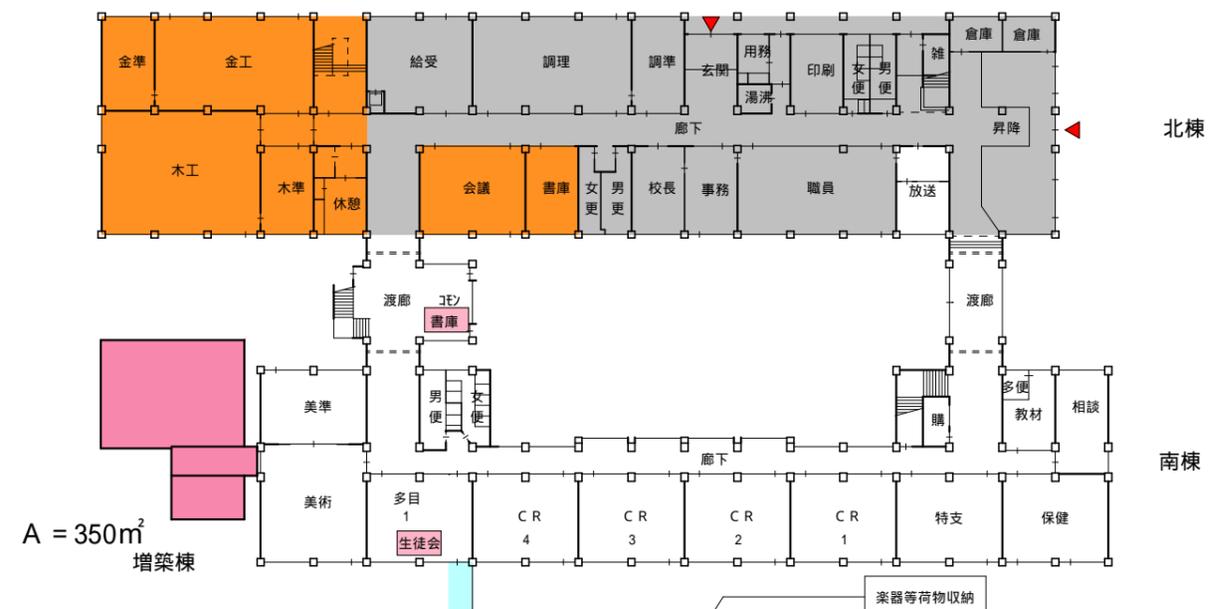

2021.4月~8月(5ヶ月) 南棟東  
 2021.8月(1ヶ月)夏休み 渡り通路・廊下

クラス数			
2020	2/2/3	7クラス	
2021	2/2/2	6クラス	

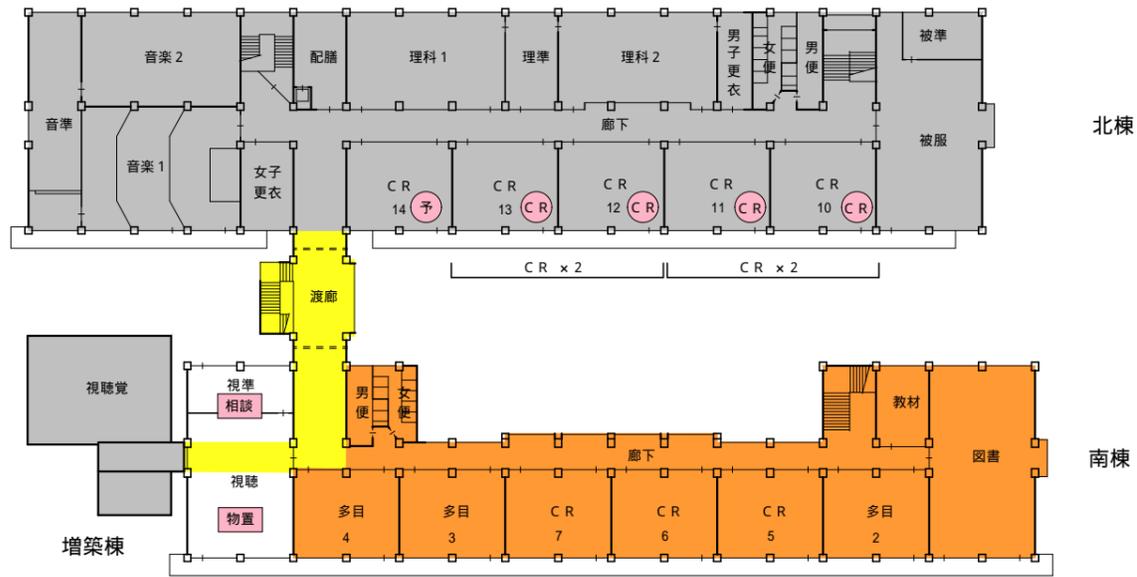


- ・予備室 2室のみ
- ・会議室, 予備室兼用
- ・保健室狭い



A = 420m<sup>2</sup>

- 内の文字は仮利用の諸室を示す
- 内の文字は仮利用の普通教室を示す

2021.9月(1ヶ月)引越  
 2021.10月~2022.1月(4ヶ月) 南棟西改修  
 仮設校舎解体

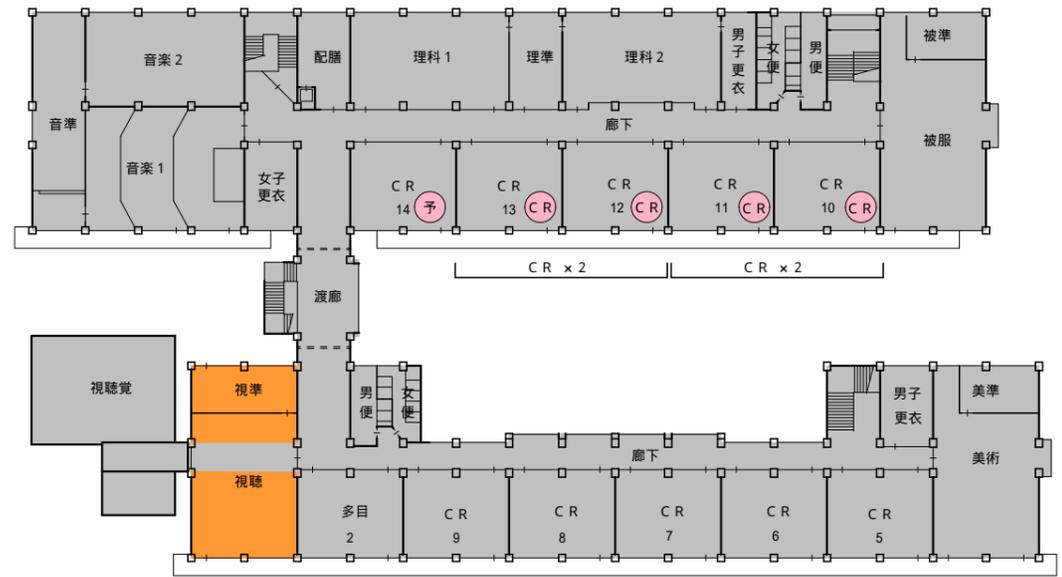

小会議室にするため  
パーティション設置



解体

- 内の文字は仮利用の諸室を示す
- 内の文字は仮利用の普通教室を示す
